




## RELATÓRIO MENSAL

# EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

MÊS: ABRIL  
ANO: 2023

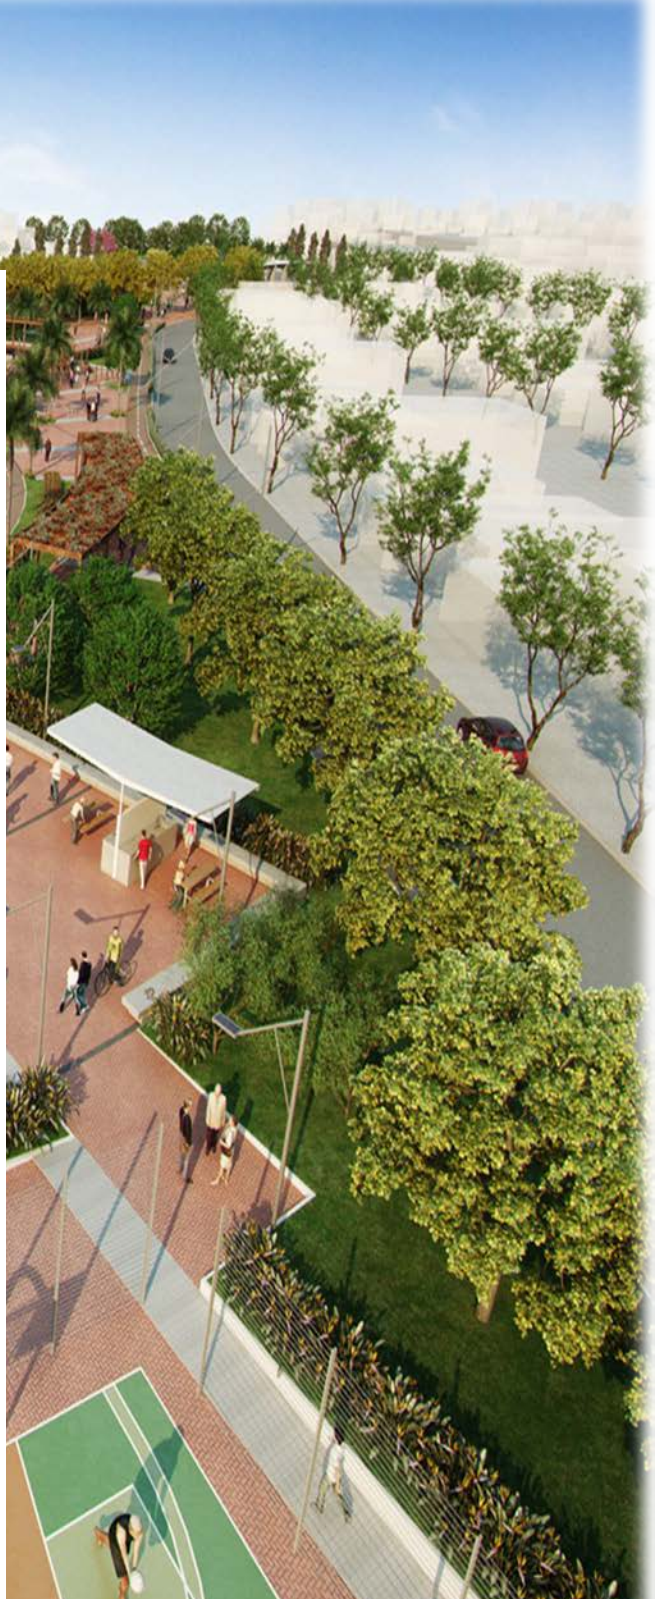

---

## Execução de obras e serviços

**Número do convênio:** 096/2021

**Objeto da obra:** Pavimentação de 5km em CBUQ da Vicinal Tauarizinho

**Nome do contratado:** Auguri Construções e Serviços Ltda

**CNPJ do contratado:** 23.086.436/0001-40

**Local da Execução da obra:** Vila Tauarizinho

**Origem do Recurso:** SETRAN

**Modalidade da licitação contratada:** Concorrência

**Número do Processo Licitatório:** 001/2021

**Data início da obra:** 12/11/2021

**Data final da obra:** 05/04/2023

**Valor total da:** R\$4.449.867,40

**Valor total aplicado:** R\$4.449.867,40

**Percentual total aplicado:** 100,00%

**Percentual mensal aplicado:** 12,95%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 576.701,14
